

Programma  
Digitalisering  
Strafrechtketen

Bijlage Rapportage  
juli tot en met december 2022  
(laatste rapportage PDSK)



Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

# Colofon

**Opdrachtgever** BKB /IB  
**Programma** Digitalisering Strafrechtketen

**Datum** 17 april 2023


**Versie** 1.0

**Status** Definitief

# Inhoudsopgave

1. Projectenportfolio 2018 - 2022	4
2. Bestedingsoverzicht 2018 -2022	6
3. Mijlpalen Programma	9
4. Lijst met afkortingen	11

# 1. Projectenportfolio 2018 - 2022

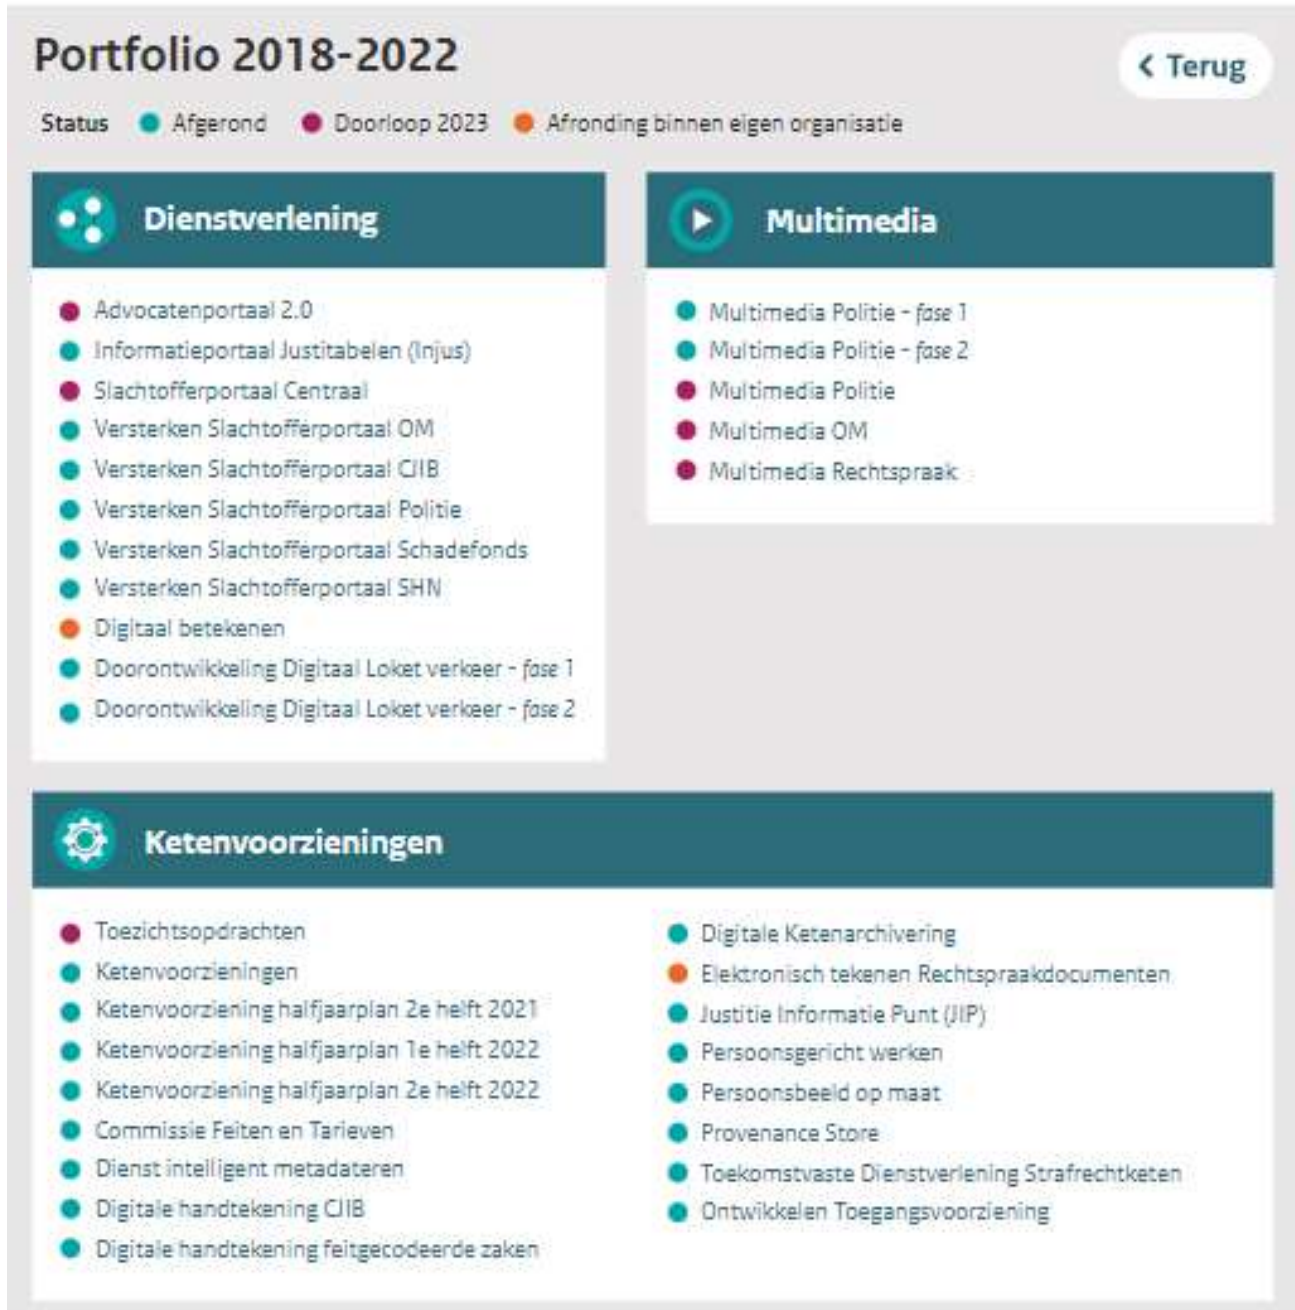



## Papierarme keten

- Aanvragen reclasseringssadviezen system tot system
- Alle Zaken Digitaal (AZD) - fase 1
- Alle Zaken Digitaal (AZD) - fase 2
- Implementatie Alle Zaken Digitaal (AZD)
- Digitalisering OM ZM (DOZ) - Executie sancties
- Digitalisering OM ZM (DOZ) - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
- Digitalisering OM ZM (DOZ) - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
- Digitaal Proces Dossier - fase 1 proeftuin en pilots
- Digitaal Proces Dossier
- Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
- Digitale documentrouting
- Digitale Samenwerkingsruimte ZSM
- Digitalisering Executie Keten (DEK) - Verbeteren informatie-uitwisseling plaatsing en detentie 1e fase
- Digitalisering Executie Keten (DEK) - i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
- Versnelling Administratieve Informatie Centrum Executieketen (VAICE) 2019/2020
- VAICE - Vernieuwing Bedrijfsvoerings Systemen (VBS) Jeugdtaakstraffen
- VAICE - VBS Jeugdtransactie / COMPAS
- VAICE - Voorlopige Hechtenis - parallel scenario
- VAICE - Resterende zaakstromen
- VAICE - DEK 1
- VAICE - DEK 2
- VAICE - Voorlopige Hechtenis (VH)
- VAICE - Vrijheid Benemende Eindbeslissing (VBE)
- Complexe Dossiers
- Uitwisseling risicogegevens - fase 1
- Uitwisseling risicogegevens - fase 2
- Bijzonder Opsporings Bevoegdheden (BOB)-module
- BOSZ Zicht op Zaken
- Dicas @ Hoge Raad - webportaal cassatie
- Dicas @ Hoge Raad
- Dicas @ Hoge Raad 2.0
- Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
- Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer 3.0
- Digitaal Werk Dossier(DWD)/Straf op DWD Aansluiten (SODA)
- Forensisch Onderzoek (FO) sporen - vooronderzoek
- Forensisch Onderzoek (FO) sporen
- Intensivering Rechtsbijstand/Bewindregister



## Overig

- Afronden Streefbeeld
- Algemene reservering innovatie
- Vooronderzoek Informatieronde
- Voorstel systeemlandschap en PCA OM (onderzoek)
- Visie op portalen
- Visie op Ketenaarchivering
- Visie op Legacy (ICT foto)
- Visie op Justid
- Visie op Persoonsgericht werken: analyse voorziening aanpak meerplegers
- Impactanalyse Digitale handtekening CJIB
- Vooronderzoek op ketenvoorzieningen
- Netwerk Datakwaliteit

## 2. Bestedingsoverzicht 2018 -2022

Omschrijving	Doel	Status	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAAL
Programma voorfase (KIS)	Algemeen		€ 600					€ 600
Programma	Algemeen			€ 600	€ 2.134	€ 1.500	€ 1.000	€ 5.234
Strategisch adviseur OGB	Algemeen				€ 100	€ 100	€ 100	€ 300
Bijdrage aan DGRR	Algemeen				€ 700	€ 700	€ 700	€ 2.100
Bijdrage aan ketenpartners	Algemeen						€ 370	€ 370
Samenwerkingsruimte	Duurzaam Digitaal Stelsel				€ 600	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.600
Versterken Architectuurraad	Duurzaam Digitaal Stelsel			€ 200	€ 500	€ 1.275	€ 1.127	€ 3.102
Versterken Portfolioraad	Duurzaam Digitaal Stelsel			€ 400	€ 500	€ 850	€ 800	€ 2.550
Duurzaam Digitaal Stelsel	Duurzaam Digitaal Stelsel				€ 20	€ 100	€ 686	€ 686
Versterken OM/ZM	Duurzaam Digitaal Stelsel			€ 611				€ 611
1 Afronden Streefbeeld	Duurzaam Digitaal Stelsel	Afgerond			€ 35			€ 35
2 Algemene reservering innovatie	Duurzaam Digitaal Stelsel	Opgenomen in DDS		€ 583	€ 612	€ 662	€ 907	€ 2.764
3 Vooronderzoek Informatieronde	Ketenvoorzieningen	Afgerond						€ 0
4 Voorstel systeemlandschap en PCA OM (onderzoek)	Ketenvoorzieningen	Afgerond						€ 0
5 Visie op portalen	Duurzaam Digitaal Stelsel	Afgerond	€ 300	€ 1.796				€ 2.096
6 Visie Ketenarchivering	Ketenvoorzieningen	Afgerond						€ 0
7 Visie op Legacy (ICT foto)	Duurzaam Digitaal Stelsel	Afgerond						€ 0
8 Visie op Justid	Duurzaam Digitaal Stelsel	Afgerond						€ 0
9 Visie Persoonsgericht werken: analyse voorziening aanpak meerplegers	Ketenvoorzieningen	Afgerond						€ 0
10 Impactanalyse Digitale handtekening CJIB	Ketenvoorzieningen	Afgerond						€ 0
11 Vooronderzoek op ketenvoorziening	Ketenvoorzieningen	Afgerond						€ 0
12 Netwerk Datakwaliteit	Duurzaam Digitaal Stelsel	Opgenomen in DDS		€ 1.424	€ 1.482	€ 1.336	€ 845	€ 5.087
13 Toezichtopdrachten	Ketenvoorzieningen	Doorloop 2023				€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
14 Ketenvoorzieningen	Ketenvoorzieningen	Afgerond			€ 633	€ 2.000		€ 2.633
15 Ketenvoorziening halfjaarplan 2e helft 2021	Ketenvoorzieningen	Afgerond				€ 1.506		€ 1.506
16 Ketenvoorziening halfjaarplan 1e helft 2022	Ketenvoorzieningen	Afgerond					€ 2.500	€ 2.500
17 Ketenvoorziening halfjaarplan 2e helft 2022	Ketenvoorzieningen	Afgerond					€ 2.464	€ 2.464
18 Commissie Feiten en Tarieven	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 18				€ 18
19 Dienst intelligent metadateren	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 760	€ 380			€ 1.140
20 Digitale handtekening CJIB	Ketenvoorzieningen	Afgerond	€ 120	€ 84	€ 416			€ 620
21 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken	Ketenvoorzieningen	Afgerond	€ 50	€ 22	€ 83			€ 155
22 Digitale Ketenarchivering	Ketenvoorzieningen	Afgerond	€ 41	€ 200	€ 250			€ 491
23 Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten	Ketenvoorzieningen	Voortgezet door eigenaar		€ 266	€ 458	€ 362	€ 75	€ 1.161
24 JIP	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 1.467	€ 1.210			€ 2.677

Omschrijving	Doel	Status	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAAL
25 Persoonsgericht werken	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 131	€ 269			€ 400
26 Persoonsbeeld op maat	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 139				€ 139
27 Provenance Store	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 172	€ 250			€ 422
28 Toekomstvast Dienstverlening Strafrechtketen	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 1.171				€ 1.171
29 Ontwikkelen Toegangsvoorziening	Ketenvoorzieningen	Afgerond		€ 35				€ 35
30 Multimedia Politie -fase 1	Multi media	Afgerond	€ 1.217					€ 1.217
31 Multimedia Politie fase 2	Multi media	Afgerond		€ 1.224	€ 1.050			€ 2.274
32 Multimedia Politie	Multi media	Doorloop naar 2023				€ 1.481	€ 2.342	€ 3.823
33 Multimedia OM	Multi media	Doorloop naar 2023				€ 150	€ 273	€ 423
34 Multimedia Rechtspraak	Multi media	Doorloop naar 2023			€ 585	€ 750	€ 720	€ 2.055
35 Aanvragen reclasserings adviezen system tot system	Papierarme Keten	Afgerond		€ 350	€ 500			€ 850
36 AZD - fase 1	Papierarme Keten	Afgerond	€ 10.000					€ 10.000
37 AZD - fase 2	Papierarme Keten	Afgerond		€ 5.590				€ 5.590
38 Implementatie AZD	Papierarme Keten	Afgerond		€ 1.754				€ 1.754
39 DOZ -Executie sancties	Papierarme Keten	Afgerond		€ 828	€ 1.574			€ 2.402
40 DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners	Papierarme Keten	Afgerond		€ 2.173	€ 1.999			€ 4.172
41 DOZ - Uitbreiding e- handtekening en vooronderzoek e- handtekening in GPS/NIAS	Papierarme Keten	Afgerond		€ 1.778	€ 3.203			€ 4.981
42 Digitaal Proces Dossier fase 1 - proeftuin en pilots	Papierarme Keten	Afgerond	€ 770	€ 4.310	€ 4.466			€ 9.546
43 Digitaal Proces Dossier	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023				€ 4.089	€ 3.791	€ 7.880
44 Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023		€ 644	€ 762	€ 910	€ 470	€ 2.786
45 Digitale documentrouting	Papierarme Keten	Afgerond		€ 255	€ 455			€ 710
46 Digitale Samenwerkingsruimte ZSM	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023		€ 381	€ 344	€ 990	€ 500	€ 2.215
47 DEK -Verbeteren informatie- uitwisseling plaatsing en detentie 1e fase	Papierarme Keten	Afgerond		€ 400				€ 400
48 Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023			€ 1.900	€ 3.965	€ 3.985	€ 9.850
49 AICE	Papierarme Keten	Afgerond			€ 4.140	€ 3.450		€ 7.590
50 VAICE - VBS Jeugdtaakstraffen	Papierarme Keten	Afgerond		€ 1.105				€ 1.105
51 VAICE - VBS Jeugdtransactie / COMPAS	Papierarme Keten	Afgerond		€ 581				€ 581
52 VAICE - Voorlopige Hechtenis -parallel scenario	Papierarme Keten	Afgerond		€ 2.490				€ 2.490
53 VAICE - Resterende zaakstromen	Papierarme Keten	Afgerond		€ 1.628				€ 1.628
54 VAICE - DEK 1	Papierarme Keten	Afgerond					€ 736	€ 736

Omschrijving	Doel	Status	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAAL
55 VAICE - DEK 2	Papierarme Keten	Afgerond					€ 644	€ 644
56 VAICE - VH	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023					€ 460	€ 460
57 VAICE - VBE	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023					€ 920	€ 920
58 Complexe Dossiers	Papierarme Keten	Afgerond		€ 2.155	€ 2.800			€ 4.955
59 Uitwisseling risicogegevens fase 1	Papierarme Keten	Afgerond		€ 300				€ 300
60 Uitwisseling risicogegevens fase 2	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023			€ 575	€ 1.123	€ 1.560	€ 3.258
61 BOB-module	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023		€ 685	€ 700		€ 150	€ 1.535
62 BOSZ Zicht op Zaken	Papierarme Keten	Afgerond		€ 952	€ 788	€ 414		€ 2.154
63 Dicas @ Hoge Raad - webportaal cassatie	Papierarme Keten	Afgerond	€ 1.035					€ 1.035
64 Dicas @ Hoge Raad	Papierarme Keten	Afgerond		€ 1.880	€ 1.925	€ 525		€ 4.330
65 Dicas @ Hoge Raad 2.0	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023				€ 360	€ 1.400	€ 1.760
66 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer	Papierarme Keten	Afgerond		€ 645	€ 1.574	€ 1.350		€ 3.569
67 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer 3.0	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023				€ 605	€ 1.725	€ 2.330
68 DWD/SODA	Papierarme Keten	Voortgezet door eigenaar		€ 78	€ 600	€ 727	€ 690	€ 2.095
69 FO sporen - vooronderzoek	Papierarme Keten	Afgerond						€ 0
70 FO sporen	Papierarme Keten	Doorloop naar 2023			€ 300	€ 1.098	€ 1.530	€ 2.928
71 Intensivering Rechtsbijstand/Bewindregister	Papierarme Keten	Afgerond		€ 280				€ 280
72 Dienstverlening - Advocatenportaal 2.0	Dienstverlening	Doorloop naar 2023		€ 303	€ 600	€ 2.086	€ 270	€ 3.259
73 Injus	Dienstverlening	Afgerond			€ 675	€ 972	€ 500	€ 2.147
74 Slachtofferportaal Centraal	Dienstverlening	Doorloop naar 2023				€ 760	€ 750	€ 1.510
75 Versterken Slachtofferportaal OM	Dienstverlening	Afgerond		€ 900	€ 1.100	€ 100		€ 2.100
76 Versterken Slachtofferportaal CJIB	Dienstverlening	Afgerond		€ 150	€ 340			€ 490
77 Versterken Slachtofferportaal Politie	Dienstverlening	Afgerond		€ 258	€ 180			€ 438
78 Versterken Slachtofferportaal Schadefonds	Dienstverlening	Afgerond		€ 100				€ 100
79 Versterken Slachtofferportaal SHN	Dienstverlening	Afgerond			€ 615			€ 615
80 Dienstverlening - Digitaal betekenen	Dienstverlening	Voortgezet door eigenaar		€ 317	€ 1.279	€ 1.652	€ 492	€ 3.740
81 Dienstverlening - Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - fase 1	Dienstverlening	Afgerond						€ 0
82 Dienstverlening - Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - fase 2	Dienstverlening	Afgerond	€ 100	€ 1.000	€ 1.189			€ 2.289
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 14.233</b>	<b>€ 45.573</b>	<b>€ 46.850</b>	<b>€ 39.948</b>	<b>€ 37.482</b>	<b>€ 184.086</b>

Bedragen x 1.000



### 3. Mijlpalen Programma

#### Fase 1: initiatie fase

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
1	Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)	31-07-2019	100%
2	Concept werkplan (PD)	12-09-2019	100%
3	Jaarplan vastgesteld (OGB)	30-10-2019	100%
4	Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld	18-12-2019	100%
5	Programma resources gestart	31-05-2020	100%
6	Werkplan vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%
7	Werkplan vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%
8	Risicoanalyse	01-06-2020	100%
9	Communicatieplan vastgesteld (OGB)	26-02-2020	100%
10	Handboek Portfoliomngt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)	25-03-2020	100%
11	(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	18-12-2019	100%

#### Fase 2: samenstellen portfolio

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
12	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%
13	Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%

#### Fase 3: intake projecten

01-01-2020 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
14	Besturing elk project inzichtelijk	01-07-2020	100%
15	Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)	01-07-2020	100%

#### Fase 4: afronding Visievorming

01-01-2020 t/m 01-07-2021

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
16	Ketendoelarchitectuur (OGB),	08-07-2020	100%
17	Ketenvoorzieningen (OGB)		
	- Opdracht	08-07-2020	100%
	- Programmaplan	31-03-2021	100%
18	Transitiearchitectuur (OGB)	Onderdeel mijlpaal 17	n.v.t.
19	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	01-05-2021	100%
20	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB)	01-07-2021	100%
21	Programmaplan		100%
	- Vaststelling (OGB)	25-11-2020	
	- Vaststelling (BKB)	03-12-2020	

#### Fase 5: besturen portfolio 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
22	Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)	31-12-2020	100%

#### Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
23	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%
24	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%
25	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2020	100%

#### Fase 7: besturen portfolio 2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
26	Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB)	Doorloop na programma	
27	Dienstverlening gerealiseerd (OGB)	Doorloop na programma	
28	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB)	31-12-2021	100%

#### Fase 8: samenstellen portfolio 2022

01-10-2021 t/m 01-12-2021

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
29	Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2021	100%
30	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12-2021	100%
31	Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2021	100%

#### Fase 9: besturen portfolio 2022

01-01-2022 t/m 31-12-2022

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
32	(Start) Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD)	31-12-2022	100%
33	Multimedia door de keten (voor VVC) gerealiseerd (OGB)	Doorloop na programma	
34	Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)	31-12-2022	100%
35	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (IB-BKB).	Q1 2023	100%

#### Fase 10: evaluatie en afronding

01-10-2022 t/m 01-12-2022

Nr	Mijlpaal	Plandatum gereed	% gereed
36	Evaluatie implementatie DDS (OGB)	Na 1 <sup>e</sup> jaar DDS	
37	Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB)	20-03-2023	100%
38	Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB).	Q1 2023	100%

## 4. Lijst met afkortingen

3RO	de drie reclasseringsinstellingen
ABB	Architectuur Bouw Blokken
ADR	Auditdienst Rijk
ADSK	Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen
AICE	Administratie- en informatiecentrum Executie
AR	Architectuurraad
AZD	Alle-Zaken-Digitaal
BAL	Besluiten- en Actielijst
BIT	Bureau ICT Toetsing
BKB	Bestuurlijk Ketenberaad
BVH	Basisvoorziening handhaving
CBE	Coördinerend Beraad Executieketen
CD	Complexe Dossiers
CDM	Canoniek Datamodel
CDO	Chief Data Officer
CJIB	Centraal Justitieel Incassobureau
DAS	Data Alliantie Strafrechtketen
DB	Digitaal Betekenen
DFEZ	Directie Financiële en Economische Zaken
DGSenB	Directoraat-generaal Straffen & Beschermen
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPD	Digitaal Proces Dossier
DPD-VVC	Digitaal Proces Dossier
DSK	Directie Strafrechtketen
DSR	Digitale Samenwerkingsruimte
DTOPS	Digitale Transformatie Opsporing Politie en Strafrechtketen
EA	Enterprise Architect
EPSC	Ethische, Privacy, Security en Compliance
EPV	Electronisch Proces-Verbaal
FO	Forensische Opsporing
GPS	Geïntegreerd Processysteem Strafrecht
ICTU	ICT Uitvoerings Organisatie
IIR	I-Interim Rijk
IRF	Inspectie der Rijksfinanciën
IT	Informatie Technologie
JUSTID	Justitiële Informatiedienst
KB-MM	Ketenbrede Multimedia
KDSK	Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen
KIV	Keten Informatievoorziening
MM	Multimedia

NFI	Nederlands Forensisch Instituut
NORA	NL Overheid Referentie Architectuur
OGB	Opdrachtgeversberaad
OM	Openbaar Ministerie
PD	Programmadirecteur
PDSK	Programma Digitalisering Strafrechtketen
PPAC	Project-, Programma- en Adviescentrum
PR	Portfolioraad
PSA	Project start architectuur
PVR	Programma Vernieuwend Registreren
QA	Quality Assurance
QRAID	Quality, Risks, Actions, Issues, Decisions
RA	Regerakkoord
RvdK	Raad voor de Kinderbescherming
SK	Strafrechtketen
SRK	Strafrechtketen
Summ-IT	Politiregistratiesysteem van de Nederlandse politie en de opvolger van de Basis Voorziening Opsporing (BVO)
TK	Tweede Kamer
TTP JUSTID	Trusted Third Party JUSTID
UBR	Uitvoeringsbedrijf Rijk
USB	Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen
VVC	Veel Voorkomende Criminaliteit
VVE	Vereniging Van Eigenaren
WODC	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
ZOZ	Zicht-Op-Zaken
ZSM	Zorgvuldig, snel en op maat
